

# Baumaßnahmen 2021 Zwischenbericht

zu Vorlage FB II/004/2021

# Baumaßnahmen 2021 - Zwischenbericht

## Neubau der Krippe

- Fertigstellung des Innenausbaus Ende März 2021, anschließend Inbetriebnahme
- derzeit Arbeiten an den Holzfassaden (zu 90% abgeschlossen) und den Außenanlagen, Fertigstellung geplant einschl. Parkplätze und öffentl. Wege im Juli 2021



# Baumaßnahmen 2021 - Zwischenbericht

## Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Lemwerder


- Fertigstellung der Außenanlagen März 2021
- Fertigstellung des Innenausbaus April 2021
- derzeit punktuell Restarbeiten diverser Gewerke
- u.a. Erhöhung Stromanschluss, Tausch der Torsteuerungen
- Lieferung der Möbel im Mai 2021, dann Inbetriebnahme



# Baumaßnahmen 2021 - Zwischenbericht

## Umbau Dorfgemeinschaftshaus Altenesch

- Vorplanung abgeschlossen
- Bauantrag eingereicht (April)
- erste Arbeiten erledigt (Rückbau Kamin, Kanalanschluss)

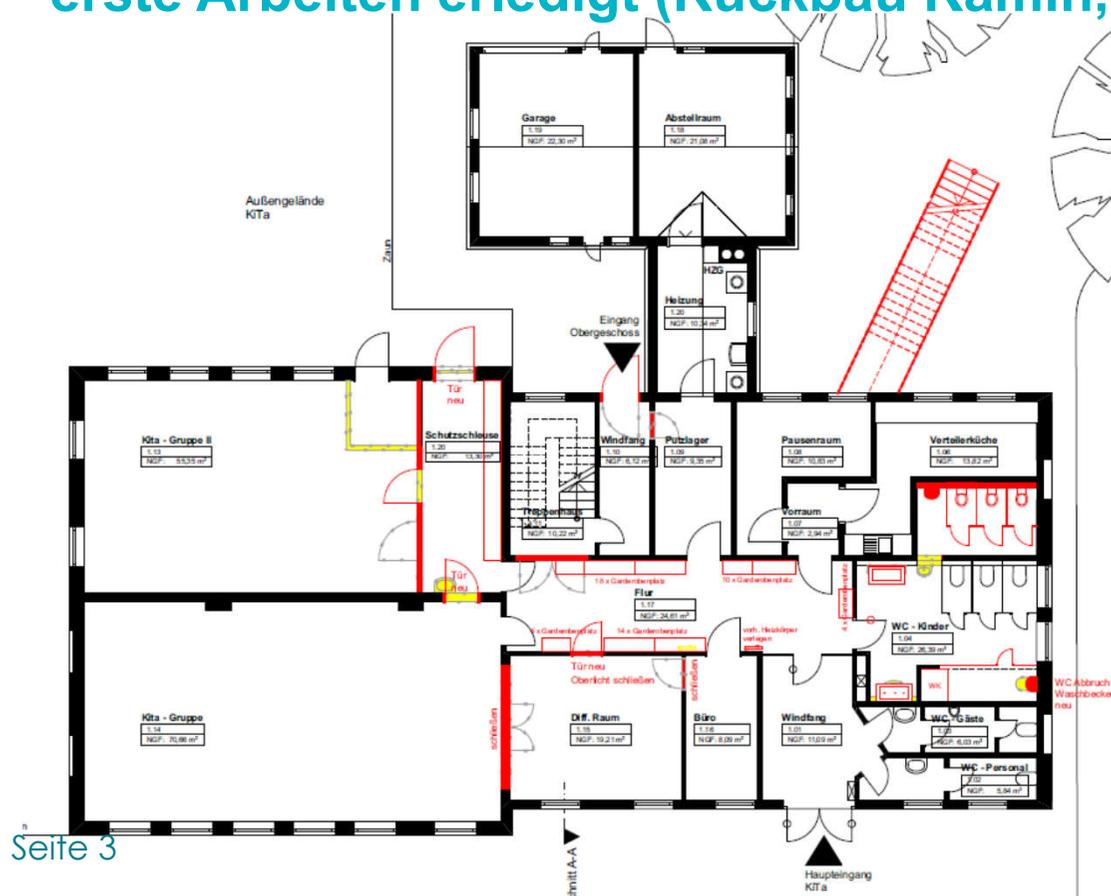

# Baumaßnahmen 2021 - Zwischenbericht

## Erneuerung der Brücke Am Rosenkamp

- Rückbau alte Brücke abgeschlossen
- derzeit Neuaufbau der Auflager und Uferbereiche
- Fertigung der Brücke im Werk
- Lieferung und Aufbau neuer Brücke am 20.05.21



# Baumaßnahmen 2021 - Zwischenbericht

## Erschließung Gewerbegebiet Edenbüttel II, Bau Kreisverkehr

- Verlegung der Versorgungsleitungen im GE abgeschlossen
- Vorbereitung der Asphaltarbeiten im GE (Asphalt KW 19 - 21)
- Herstellung der Grundstückszufahrten (Betriebe und Feuerwehr)



# Baumaßnahmen 2021 - Zwischenbericht

## Erschließung Gewerbegebiet Edenbüttel II, Bau Kreisverkehr

- derzeit Verlegung und Änderung diverser Versorgungsleitungen im Kreuzungsbereich
- anschließend Herstellung der Tragschichten (KW 22 - 24)
- Asphaltarbeiten (KW 25 - 26), Inbetriebnahme im Anschluss
- Restarbeiten bis 30.07.21





**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

FB II
